
Lotes das obras do DNIT na BR-116/BA

Adequação da BR-116/BA pelo DNIT (RDC 292/2014) · Concessão Rota dos Sertões · Contrato ANTT nº 1/2026

Gerência de Engenharia
Folha A3 · Rev. 00 · 03/11/2026
6 lotes · 428,9 km

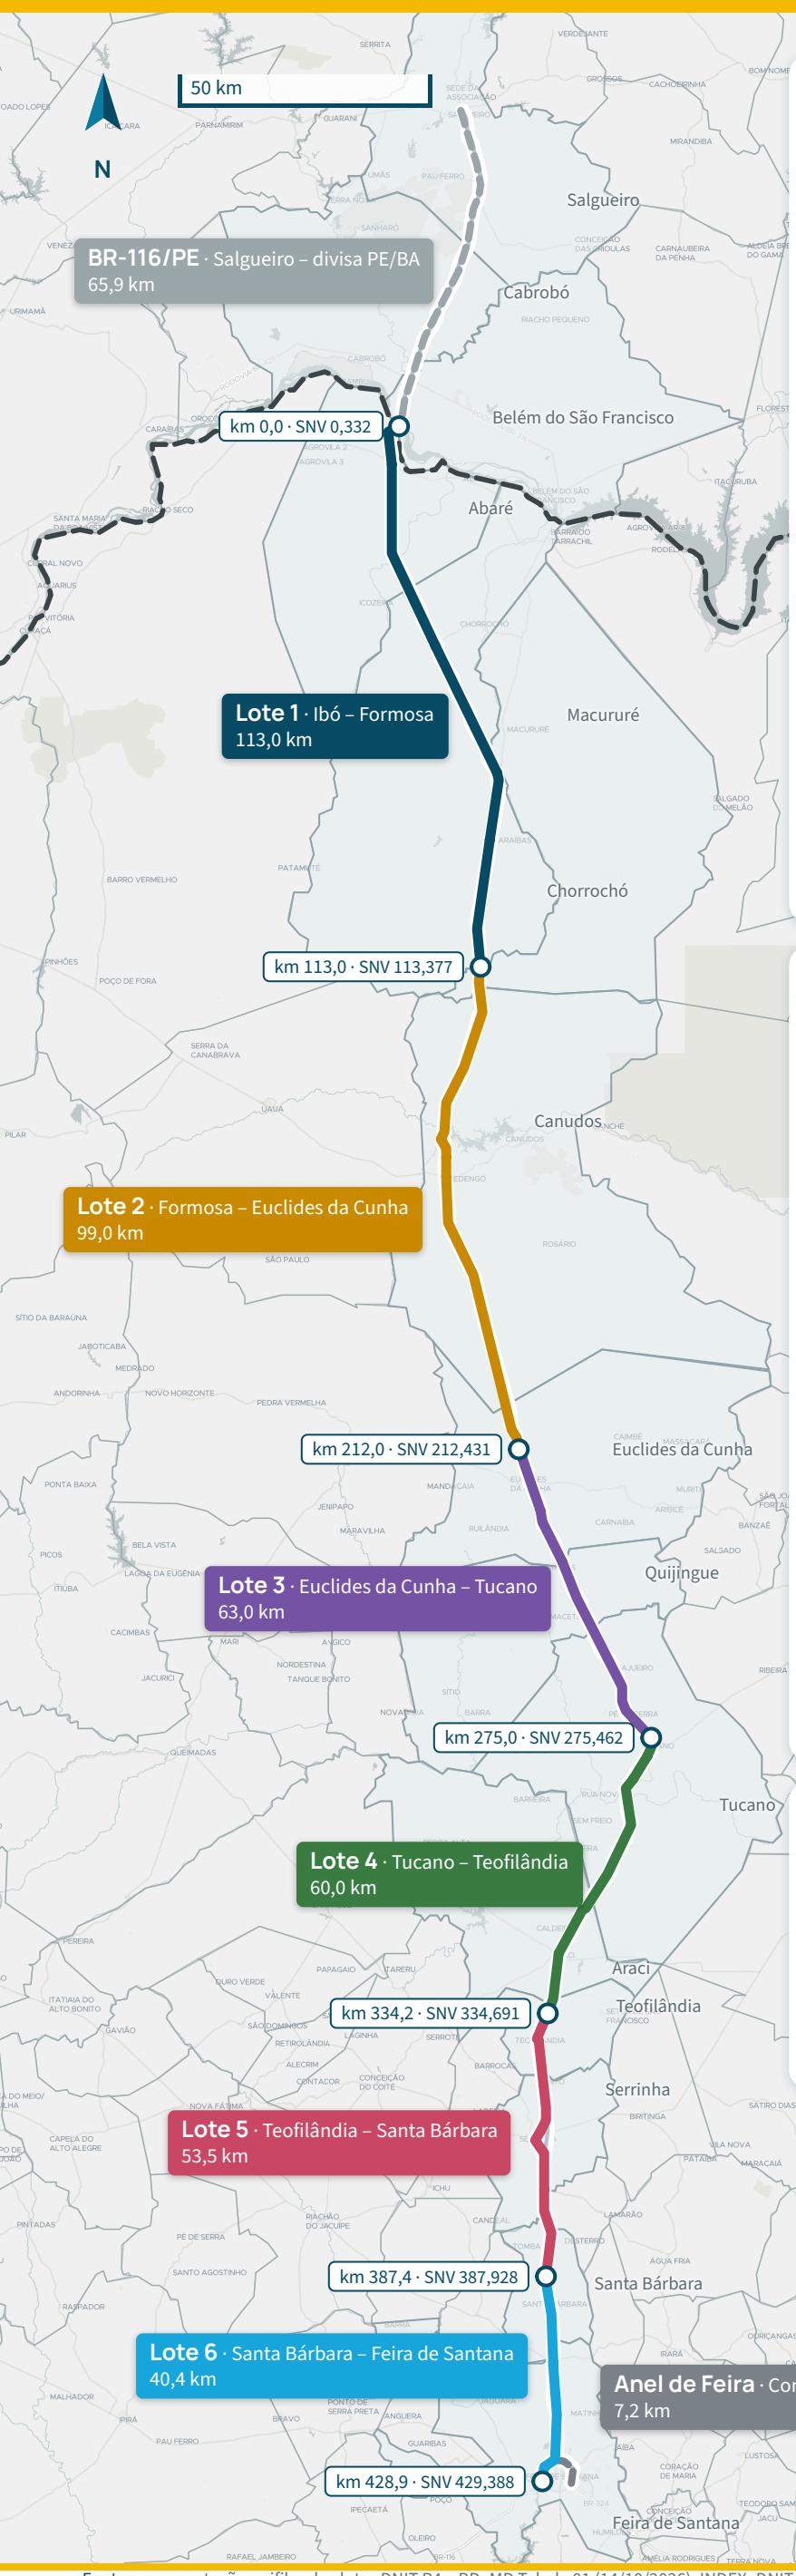

Lotes, limites e contratos

Lote	Trecho	km PER início	km PER fim	km SNV 202607A início	km SNV 202607A fim	Ext. (km)	Consórcio	Contrato DNIT
1	Ibó – Formosa BR-116/BA	0,0	113,0	0,332	113,377	113,0	CCL / LCM / PSO / PRODEC	05 00875/2014
2	Formosa – Euclides da Cunha BR-116/BA	113,0	212,0	113,377	212,431	99,0	LCM / CCL / JDS	05 00858/2014
3	Euclides da Cunha – Tucano BR-116/BA	212,0	≈275,0	212,431	275,462	63,0	CBV / Construterra / EBRAE / Geosistemas	SR-05/00876/2014
4	Tucano – Teofilândia BR-116/BA	≈275,0	334,2	275,462	334,691	60,0	Sem contrato ativo capas dos projetos: CBV / Construterra / EBRAE / Geosistemas	SR-05/00877/2014 (não ativo)
5	Teofilândia – Santa Bárbara BR-116/BA	334,2	387,4	334,691	387,928	53,5	SVC / TOP / Paviservice / EGTC	379/2024 (remanescente)
6	Santa Bárbara – Feira de Santana BR-116/BA	387,4	≈428,9	387,928	429,388	40,4	Amorim Barreto / EMPA / Basitec	SR-05/00879/2014
Anel	Contorno de Feira de Santana BR-324/BA	512,5	519,7	513,5	520,7	7,2	a confirmar	05 00287/2025
PE	Salgueiro – divisa PE/BA BR-116/PE	25,7	91,6	25,600	91,494	65,9	a confirmar	a obter
	6 lotes da BR-116/BA					428,9		

km PER: limites nominais do unifilar R4 (referencial contratual). km SNV 202607A: mesmo ponto no eixo do DNIT, pelo método da OF-ENG-001/2026 REV02. Extensão nominal do unifilar (mantidas as divergências com o painel do DNIT). Limite Lote 3/Lote 4 aproximado (km 275); fim do Lote 6 estendido até o km 428,9, limite do sistema. Lote 4: o contrato SR-05/00877/2014 (RDC 292/2014) consta nas capas dos projetos, mas não está ativo nem há previsão de contratação (Ofício 88095, item 5). Lote 5: contrato remanescente 379/2024 (contratação integrada); o contrato original de 2014 segue a confirmar. Anel e BR-116/PE em cinza: contexto, fora do somatório.

Situação das obras e tratamento regulatório

Lote	Situação da obra	Executado	Vigência	Tratamento regulatório
1	Concluído, com pendências de obras complementares (interseções com iluminação de Abaré, Chorrochó, Macururé e Caraíbas)	91,32 % Ofício 88095, 26/03/2026	31/01/2027	CR 4
2	Paralisado por falta de verba; acostamento em 48,35 km descontínuos; projeto de OAEs pendente de aprovação	44,08 % Ofício 88095, 26/03/2026	28/01/2027	CR 6: arrolado
3	Paralisado por falta de verba	—	—	regra geral
4	Sem obra do DNIT; duplicação no escopo da concessão, sem reequilíbrio	—	—	CR 4
5	Paralisado; terraplenagem nos segmentos com projeto aprovado, restrições de RGV e desapropriação; exsudação km 364,38–374,64	4 % Ofício 88095, 26/03/2026 (painel DNIT: 20,31 %)	29/09/2028	CR 6: 14 km no MEF
6	Concluído; Termo de Recebimento Provisório emitido	99,52 % painel DNIT	—	regra geral; vícios ocultos até 5 anos (cl. 22.4.2)
Anel	Em andamento, ritmo lento nas frentes de drenagem; ordem de início 05/06/2025; interferências com redes de água, esgoto e energia	1,83 % Ofício 88095, 26/03/2026	conclusão prevista 26/11/2026	CR 6: fica com o DNIT; Obra Superveniente (cl. 8.7)
PE	Em andamento (informação de 14/10/2026)	—	—	regra geral

Situação: BD_MD Tabela 01 (14/10/2026) e Ofício nº 88095/2026/COAC/CGCONT/DIR/DNIT SEDE (26/03/2026, data room ANTT). Executado: percentual concluído informado pelo DNIT no ofício ou no painel do empreendimento (print de 14/10/2026). Vigência: prazo contratual vigente informado no ofício. CR 4 e CR 6: Comunicados Relevantes da concessão; regra geral: cláusulas 4.2.3 e 4.2.4 do Contrato 1/2026. "—": dado a obter.

Legenda

- Lote 1 · Ibó – Formosa
- Lote 2 · Formosa – Euclides da Cunha
- Lote 3 · Euclides da Cunha – Tucano
- Lote 4 · Tucano – Teofilândia
- Lote 5 · Teofilândia – Santa Bárbara
- Lote 6 · Santa Bárbara – Feira de Santana
- Anel de Feira (BR-324/BA) e BR-116/PE: contexto
- Limite de lote (km PER · km SNV)
- Divisa PE / BA
- Limite municipal (IBGE 2024)

© MapTiler © OpenStreetMap

Fontes: apresentação unifilar dos lotes DNIT R4 e BD_MD Tabela 01 (14/10/2026); INDEX_DNIT (GEN.116S - 12 Acervo DNIT, 03/11/2026: capas dos volumes e processos SEI 50605.000863/2014-50, 50605.000133 a 136/2015); Ofício nº 88095/2026/COAC/CGCONT/DIR/DNIT SEDE (26/03/2026); Comunicados Relevantes nº 4 e nº 6; limites dos lotes no eixo SNV DNIT 202607A (Mapa dos lotes TATB R00, 28/10/2026); malha municipal IBGE 2024; base cartográfica © MapTiler © colaboradores do OpenStreetMap.
Nota: mapa de consulta interna, projeção Web Mercator (EPSG:3857), coordenadas de origem SIRGAS 2000; não é planta cadastral. Números de contrato dos Lotes 3 e 6 citados nos volumes e processos SEI; confirmar no SIAC antes de uso em documento oficial.
